

○焼却設備

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	2025年5月21日	2025年5月20日
	2025年7月17日	2025年7月18日
	2025年9月16日	2025年9月17日
	2025年11月11日	2025年11月12日
	2026年1月14日	2026年1月13日
	2026年3月24日	2026年3月25日


[illegible]

(3) 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突排ガス中のCO濃度

(日平均値の月平均値)

測定月	結果が得られた日	燃焼温度	集塵機流入ガス温度	CO濃度
4月	4月30日	891℃	191℃	9 ppm
5月	5月31日	896℃	190℃	7 ppm
6月	6月30日	915℃	191℃	6 ppm
7月	7月31日	893℃	188℃	13 ppm
8月	8月31日	894℃	188℃	12 ppm
9月	9月30日	892℃	188℃	8 ppm
10月	10月31日	884℃	188℃	10 ppm
11月	11月30日	888℃	188℃	10 ppm
12月	12月31日	885℃	187℃	11 ppm
1月	1月31日	866℃	188℃	10 ppm
2月	2月28日	875℃	190℃	10 ppm
3月	3月31日	880℃	188℃	7 ppm

(4) 測定位置

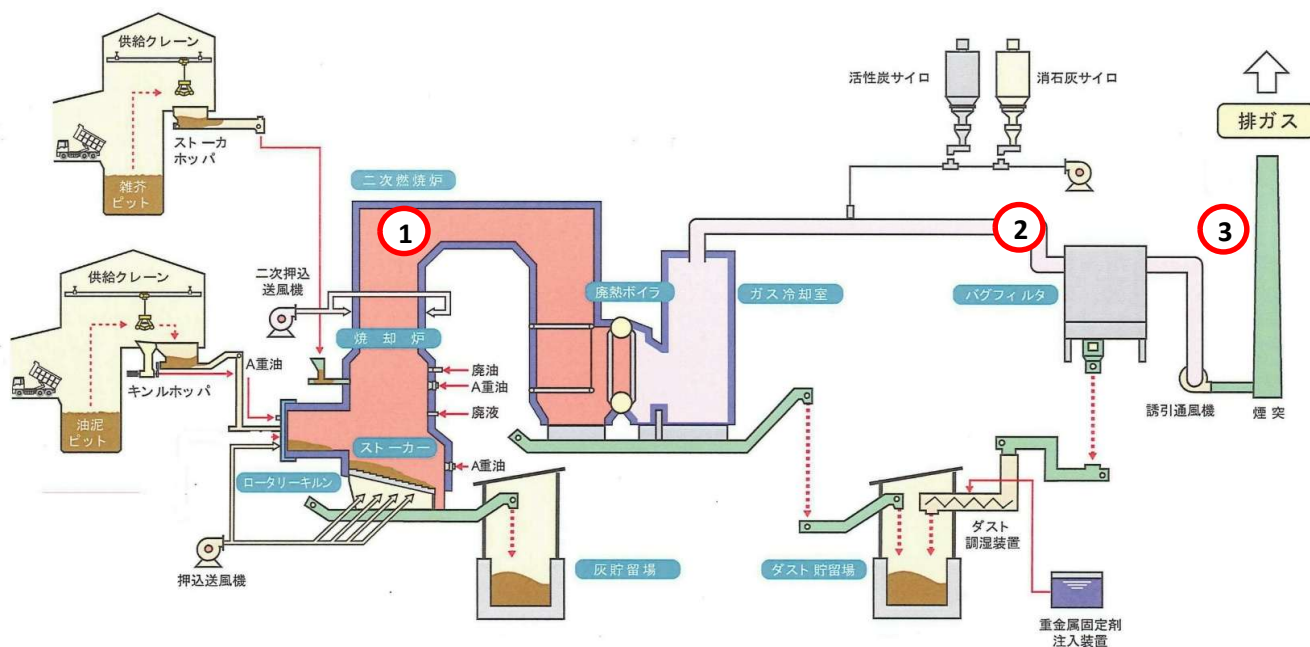

- ① 燃焼室温度測定位置 ② 集塵機流入温度測定位置 ③ CO測定位置、排ガス測定位置
